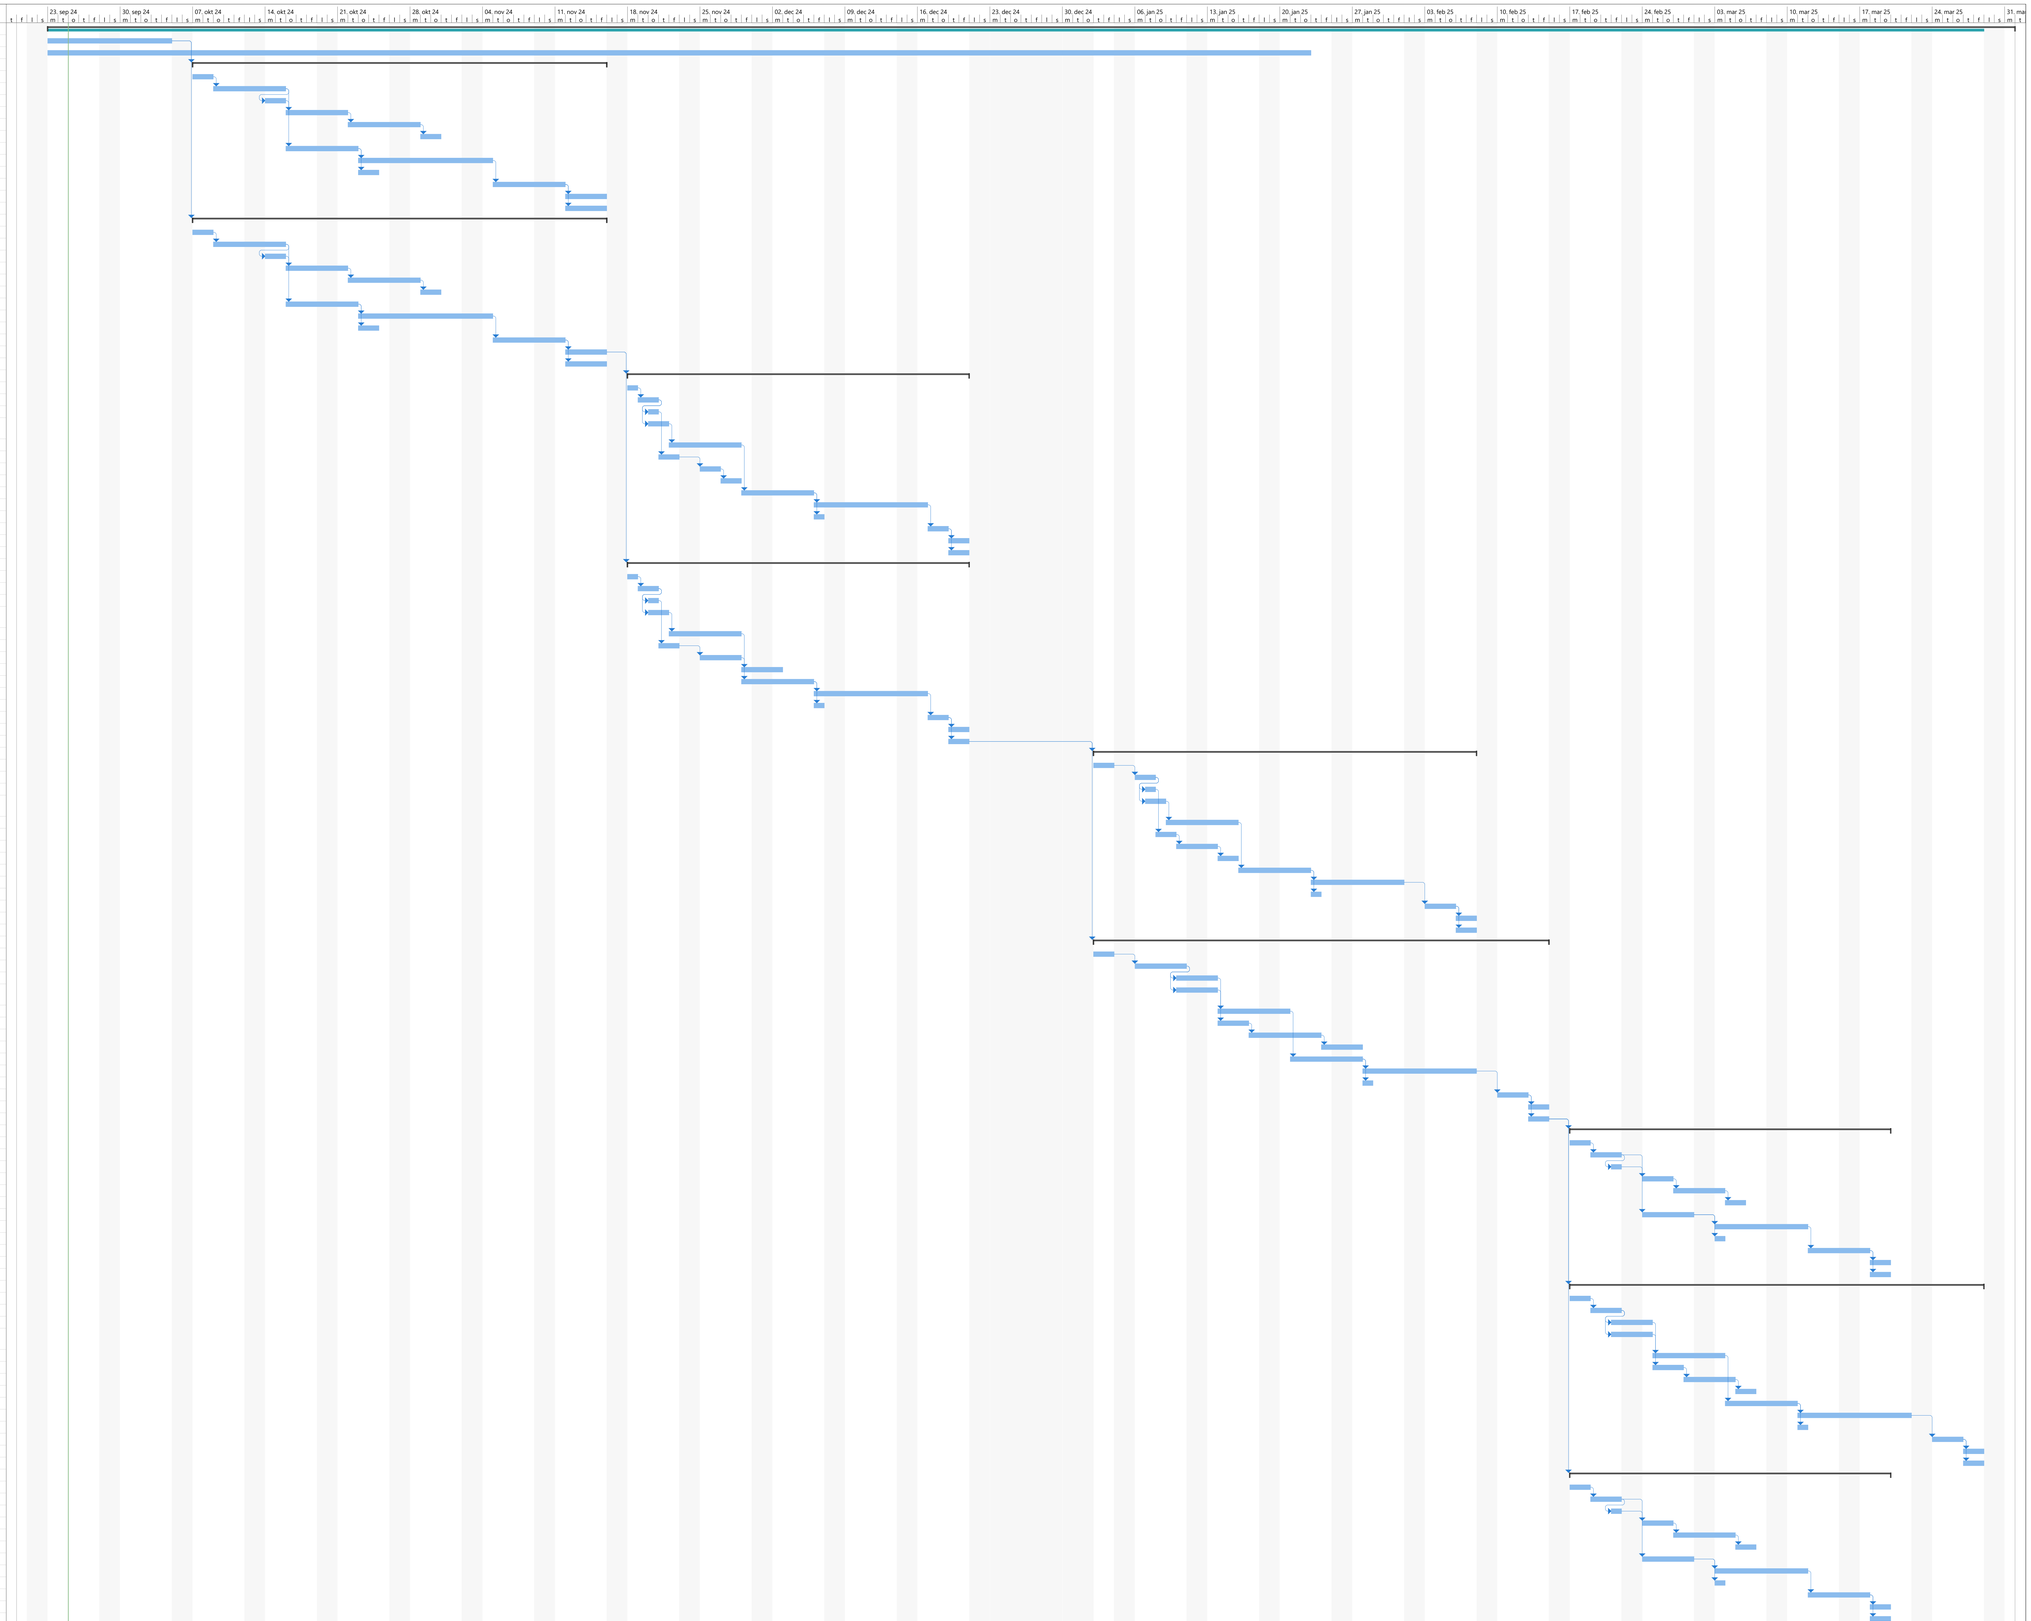Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Ressourcenavne
1		**Mozartshus**	**128 dage**	**ma 23-09-24**	**ma 31-03-25**		
2		Byggeplads	10 dage	ma 23-09-24	fr 04-10-24		
3		Kælderledninger	80 dage	ma 23-09-24	on 22-01-25		
4		**Straussvej 3**	**30 dage**	**ma 07-10-24**	**fr 15-11-24**	**2**	
5		Afdækning af lejligheder	2 dage	ma 07-10-24	ti 08-10-24		
6		Tømrer demontering	5 dage	on 09-10-24	ti 15-10-24	5	
7		Nedskæring af rør	2 dage	ma 14-10-24	ti 15-10-24	6AS-2 dage	
8		Udboring af bøsninger	4 dage	on 16-10-24	ma 21-10-24	7	
9		Relining faldstammer	5 dage	ti 22-10-24	ma 28-10-24	8	
10		Lukning af gamle huller	2 dage	ti 29-10-24	on 30-10-24	9	
11		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	on 16-10-24	ti 22-10-24	6	
12		Koblingsledninger	9 dage	on 23-10-24	ma 04-11-24	11	
13		Isolering stigstrenge	2 dage	on 23-10-24	to 24-10-24	11	
14		Reetablering tømrer	5 dage	ti 05-11-24	ma 11-11-24	12	
15		Reetablering maler	4 dage	ti 12-11-24	fr 15-11-24	14	
16		Reetablering murer	4 dage	ti 12-11-24	fr 15-11-24	14	
17		**Straussvej 5**	**30 dage**	**ma 07-10-24**	**fr 15-11-24**	**2**	
18		Afdækning af lejligheder	2 dage	ma 07-10-24	ti 08-10-24		
19		Tømrer demontering	5 dage	on 09-10-24	ti 15-10-24	18	
20		Nedskæring af rør	2 dage	ma 14-10-24	ti 15-10-24	19AS-2 dage	
21		Udboring af bøsninger	4 dage	on 16-10-24	ma 21-10-24	20	
22		Relining faldstammer	5 dage	ti 22-10-24	ma 28-10-24	21	
23		Lukning af gamle huller	2 dage	ti 29-10-24	on 30-10-24	22	
24		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	on 16-10-24	ti 22-10-24	19	
25		Koblingsledninger	9 dage	on 23-10-24	ma 04-11-24	24	
26		Isolering stigstrenge	2 dage	on 23-10-24	to 24-10-24	24	
27		Reetablering tømrer	5 dage	ti 05-11-24	ma 11-11-24	25	
28		Reetablering maler	4 dage	ti 12-11-24	fr 15-11-24	27	
29		Reetablering murer	4 dage	ti 12-11-24	fr 15-11-24	27	
30		**Straussvej 7**	**25 dage**	**ma 18-11-24**	**fr 20-12-24**	**28**	
31		Afdækning af lejligheder	1 dag	ma 18-11-24	ma 18-11-24		
32		Tømrer demontering	2 dage	ti 19-11-24	on 20-11-24	31	
33		Nedskæring af rør	1 dag	on 20-11-24	on 20-11-24	32AS-1 dag	
34		Demontering af gammel køkken faldstamme	2 dage	on 20-11-24	to 21-11-24	32AS-1 dag	
35		Opbygning af ny køkken faldstamme	5 dage	fr 22-11-24	to 28-11-24	34	
36		Udboring af bøsninger	2 dage	to 21-11-24	fr 22-11-24	33	
37		Relining faldstammer	2 dage	ma 25-11-24	ti 26-11-24	36	
38		Lukning af gamle huller	2 dage	on 27-11-24	to 28-11-24	37	
39		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	fr 29-11-24	to 05-12-24	35	
40		Koblingsledninger	7 dage	fr 06-12-24	ma 16-12-24	39	
41		Isolering stigstrenge	1 dag	fr 06-12-24	fr 06-12-24	39	
42		Reetablering tømrer	2 dage	ti 17-12-24	on 18-12-24	40	
43		Reetablering maler	2 dage	to 19-12-24	fr 20-12-24	42	
44		Reetablering murer	2 dage	to 19-12-24	fr 20-12-24	42	
45		**Straussvej 9**	**25 dage**	**ma 18-11-24**	**fr 20-12-24**	**28**	
46		Afdækning af lejligheder	1 dag	ma 18-11-24	ma 18-11-24		
47		Tømrer demontering	2 dage	ti 19-11-24	on 20-11-24	46	
48		Nedskæring af rør	1 dag	on 20-11-24	on 20-11-24	47AS-1 dag	
49		Demonteriing af gammel køkken faldstamme	2 dage	on 20-11-24	to 21-11-24	47AS-1 dag	
50		Opbygning af ny køkken faldstamme	5 dage	fr 22-11-24	to 28-11-24	49	
51		Udboring af bøsninger	2 dage	to 21-11-24	fr 22-11-24	48	
52		Relining faldstammer	4 dage	ma 25-11-24	to 28-11-24	51	
53		Lukning af gamle huller	2 dage	fr 29-11-24	ma 02-12-24	52	
54		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	fr 29-11-24	to 05-12-24	50	
55		Koblingsledninger	7 dage	fr 06-12-24	ma 16-12-24	54	
56		Isolering stigstrenge	1 dag	fr 06-12-24	fr 06-12-24	54	
57		Reetablering tømrer	2 dage	ti 17-12-24	on 18-12-24	55	
58		Reetablering maler	2 dage	to 19-12-24	fr 20-12-24	57	
59		Reetablering murer	2 dage	to 19-12-24	fr 20-12-24	57	
60		**Straussvej 11**	**27 dage**	**to 02-01-25**	**fr 07-02-25**	**59**	
61		Afdækning af lejligheder	2 dage	to 02-01-25	fr 03-01-25		
62		Tømrer demontering	2 dage	ma 06-01-25	ti 07-01-25	61	
63		Nedskæring af rør	1 dag	ti 07-01-25	ti 07-01-25	62AS-1 dag	
64		Demontering af gammel køkken faldstamme	2 dage	ti 07-01-25	on 08-01-25	62AS-1 dag	
65		Opbygning af ny køkken faldstamme	5 dage	to 09-01-25	on 15-01-25	64	
66		Udboring af bøsninger	2 dage	on 08-01-25	to 09-01-25	63	
67		Relining faldstammer	2 dage	fr 10-01-25	ma 13-01-25	66	
68		Lukning af gamle huller	2 dage	ti 14-01-25	on 15-01-25	67	
69		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	to 16-01-25	on 22-01-25	65	
70		Koblingsledninger	7 dage	to 23-01-25	fr 31-01-25	69	
71		Isolering stigstrenge	1 dag	to 23-01-25	to 23-01-25	69	
72		Reetablering tømrer	3 dage	ma 03-02-25	on 05-02-25	70	
73		Reetablering maler	2 dage	to 06-02-25	fr 07-02-25	72	
74		Reetablering murer	2 dage	to 06-02-25	fr 07-02-25	72	
75		**Straussvej 13**	**32 dage**	**to 02-01-25**	**fr 14-02-25**	**59**	
76		Afdækning af lejligheder	2 dage	to 02-01-25	fr 03-01-25		
77		Tømrer demontering	5 dage	ma 06-01-25	fr 10-01-25	76	
78		Nedskæring af rør	2 dage	fr 10-01-25	ma 13-01-25	77AS-1 dag	
79		Demonteriing af gammel køkken faldstamme	2 dage	fr 10-01-25	ma 13-01-25	77AS-1 dag	
80		Opbygning af ny køkken faldstamme	5 dage	ti 14-01-25	ma 20-01-25	79	
81		Udboring af bøsninger	3 dage	ti 14-01-25	to 16-01-25	78	
82		Relining faldstammer	5 dage	fr 17-01-25	to 23-01-25	81	
83		Lukning af gamle huller	2 dage	fr 24-01-25	ma 27-01-25	82	
84		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	ti 21-01-25	ma 27-01-25	80	
85		Koblingsledninger	9 dage	ti 28-01-25	fr 07-02-25	84	
86		Isolering stigstrenge	1 dag	ti 28-01-25	ti 28-01-25	84	
87		Reetablering tømrer	3 dage	ma 10-02-25	on 12-02-25	85	
88		Reetablering maler	2 dage	to 13-02-25	fr 14-02-25	87	
89		Reetablering murer	2 dage	to 13-02-25	fr 14-02-25	87	
90		**Straussvej 15**	**23 dage**	**ma 17-02-25**	**on 19-03-25**	**89**	
91		Afdækning af lejligheder	2 dage	ma 17-02-25	ti 18-02-25		
92		Tømrer demontering	3 dage	on 19-02-25	fr 21-02-25	91	
93		Nedskæring af rør	1 dag	fr 21-02-25	fr 21-02-25	92AS-1 dag	
94		Udboring af bøsninger	3 dage	ma 24-02-25	on 26-02-25	93	
95		Relining faldstammer	5 dage	to 27-02-25	ma 03-03-25	94	
96		Lukning af gamle huller	2 dage	ti 04-03-25	on 05-03-25	95	
97		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	ma 24-02-25	fr 28-02-25	92	
98		Koblingsledninger	7 dage	ma 03-03-25	ti 11-03-25	97	
99		Isolering stigstrenge	1 dag	ma 03-03-25	ma 03-03-25	97	
100		Reetablering tømrer	4 dage	on 12-03-25	ma 17-03-25	98	
101		Reetablering maler	2 dage	ti 18-03-25	on 19-03-25	100	
102		Reetablering murer	2 dage	ti 18-03-25	on 19-03-25	100	
103		**Straussvej 17**	**30 dage**	**ma 17-02-25**	**fr 28-03-25**	**89**	
104		Afdækning af lejligheder	2 dage	ma 17-02-25	ti 18-02-25		
105		Tømrer demontering	3 dage	on 19-02-25	fr 21-02-25	104	
106		Nedskæring af rør	2 dage	fr 21-02-25	ma 24-02-25	105AS-1 dag	
107		Demonteriing af gammel køkken faldstamme	2 dage	fr 21-02-25	ma 24-02-25	105AS-1 dag	
108		Opbygning af ny køkken faldstamme	5 dage	ti 25-02-25	ma 03-03-25	107	
109		Udboring af bøsninger	3 dage	ti 25-02-25	to 27-02-25	106	
110		Relining faldstammer	3 dage	fr 28-02-25	ti 04-03-25	109	
111		Lukning af gamle huller	2 dage	on 05-03-25	to 06-03-25	110	
112		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	ti 04-03-25	ma 10-03-25	108	
113		Koblingsledninger	9 dage	ti 11-03-25	fr 21-03-25	112	
114		Isolering stigstrenge	1 dag	ti 11-03-25	ti 11-03-25	112	
115		Reetablering tømrer	3 dage	ma 24-03-25	on 26-03-25	113	
116		Reetablering maler	2 dage	to 27-03-25	fr 28-03-25	115	
117		Reetablering murer	2 dage	to 27-03-25	fr 28-03-25	115	
118		**Mozartsvej 15**	**23 dage**	**ma 17-02-25**	**on 19-03-25**	**89**	
119		Afdækning af lejligheder	2 dage	ma 17-02-25	ti 18-02-25		
120		Tømrer demontering	3 dage	on 19-02-25	fr 21-02-25	119	
121		Nedskæring af rør	1 dag	fr 21-02-25	fr 21-02-25	120AS-1 dag	
122		Udboring af bøsninger	3 dage	ma 24-02-25	on 26-02-25	121	
123		Relining faldstammer	4 dage	to 27-02-25	ti 04-03-25	122	
124		Lukning af gamle huller	2 dage	on 05-03-25	to 06-03-25	123	
125		opbygning af nye stigstrenge	5 dage	ma 24-02-25	fr 28-02-25	120	
126		Koblingsledninger	7 dage	ma 03-03-25	ti 11-03-25	125	
127		Isolering stigstrenge	1 dag	ma 03-03-25	ma 03-03-25	125	
128		Reetablering tømrer	4 dage	on 12-03-25	ma 17-03-25	126	
129		Reetablering maler	2 dage	ti 18-03-25	on 19-03-25	128	
130		Reetablering murer	2 dage	ti 18-03-25	on 19-03-25	128
