Revision 1
AB Mozartshus

Gantt start	Uger	Weekend
03-08-20	12	N
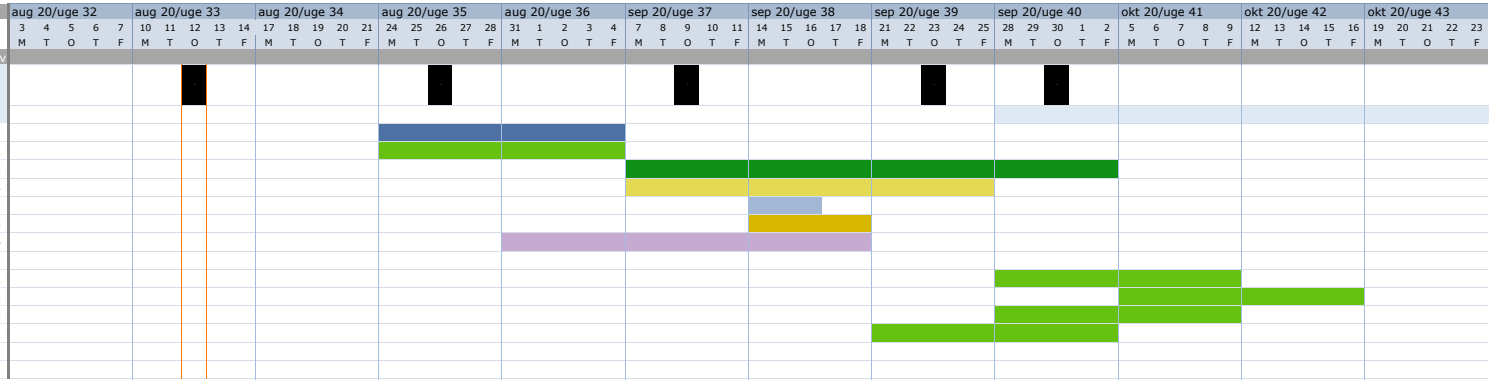
ID	Opgavenavn	Ansvar	Startdato	Dg	Slutdato	Frv
9	Byggemøder/mangelgennemgang og aflevering					
10	Byggeplads					
11	Afrensning af vanger kældertrapper	JB	23-08-20	14	05-09-20	1
12	Ophugning af bund i kældertrapper	JB	23-08-20	14	05-09-20	2
13	Nyt afløb og støbning af bund	JB	07-09-20	28	04-10-20	3
14	Oppudsning af vanger	JB	07-09-20	21	27-09-20	4
15	Ny kant (1 stk. som medregnet)	JB	14-09-20	3	16-09-20	
16	Sokkel gård og gade	JB	14-09-20	5	18-09-20	5
17	Drypnæser altaner	JB	31-08-20	21	20-09-20	6
10	Maler					
21	Afrensning af værn	TD	28-09-20	14	11-10-20	2
22	Maling af værn	TD	05-10-20	14	18-10-20	2
23	Maling af kældervangder	TD	28-09-20	14	11-10-20	2
24	Maling af sokkel	TD	21-09-20	14	04-10-20	2
